SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGA

IBERDROLA

ESCALA 1:30.000
FEB 2017

C.H. GOUVÃES

ESCALA 1:5.000

A.H. ALTO TÂMEGA

ESCALA 1:5.000

A.H. DAIVÕES

ESCALA 1:5.000


BARRAGEM GOUVÃES

ESCALA 1:5.000

TAM LBrev1 ACT 1709-1

ACT 01-10-2017

Activity ID	Activity name (Portugues)	Start	Finish
PROJETO SE ÁLTO TÂMEGA LB rev1 ACT 1709		08-12-14 A	03-02-23
PROGRAMA RESUMO		08-12-14 A	03-02-23
SUBESTAÇOES E LINHAS		06-01-16 A	03-06-22
RES1050	Subestação 60/20 kV	06-01-16 A	13-04-17 A
RES1040	PC 60 KV EDP	07-01-16 A	28-12-16 A
RES1080	Linhas 60 kV EDP	07-01-16 A	17-03-17 A
RES1090	Linhas 20 kV	07-01-16 A	01-06-17 A
RES1010	PC GOUVAES 400 Kv	17-07-18	21-08-20
RES1030	PC Daivões 400 Kv	24-09-18	12-05-21
RES1070	Linhas 400 kV	20-05-19	03-06-22
RES1020	PC Tâmega 400 Kv	03-01-20	03-06-22
RES1060	Posições 400 kV em Subestações REN	06-04-20	21-08-20
COMUNS		15-07-16 A	24-06-21
RES1000	Pedreira	15-07-16 A	24-06-21
GOUVÃES		08-12-14 A	29-12-21
ACESSOS		08-12-14 A	15-07-16 A
RES1100	Acesso exterior à central de Gouvães	08-12-14 A	22-06-15 A
RES1110	Acessos em Túnel à central de Gouvães	31-08-15 A	15-07-16 A
RES1120	Acesso e plataforma da Subestação	27-11-15 A	01-01-16 A
CENTRAL		13-10-16 A	23-12-20
RES1150	Escavação	13-10-16 A	05-01-18
RES1160	Betonagem	05-01-18	30-08-19
RES1180	Montagem partes embebidas de Grupo	02-02-18	25-02-19
RES1170	Arquitetura e acabamentos Central	01-05-19	14-11-19
RES1830	Montagem Grupos	23-05-19	23-12-20
GOUVÃES, TÚNEL DE ADUÇÃO E CHAMINÉ SUPERIOR DE EQUILIBRIO		28-02-17 A	24-08-20
RES1190	Escavação	28-02-17 A	04-10-18
RES1200	Betonagem	28-08-18	23-03-20
RES1790	Montagem	04-09-18	24-08-20
CIRCUITO HIDRÁULICO - FORÇADA		05-10-16 A	22-01-21
RES1210	Escavação	05-10-16 A	15-09-17 A
RES1220	Montagem e betonagens	04-09-17 A	09-04-20
RES1230	Tratamentos e enchimento da adução e forçada	26-07-18	22-01-21
CIRCUITO HIDRÁULICO - ASPIRAÇÃO, CHAMINÉ INFERIOR DE EQUILIBRIO E TOMADA EM DAIVÕES		13-02-17 A	14-01-21
RES1240	Escavação	13-02-17 A	12-01-18
RES1250	Betonagem	29-01-18	09-01-20
RES1260	Enchimento (até a cota 220)	16-12-20	14-01-21
BARRAGEM		26-11-18	25-02-21
RES1270	Escavação Barragem	26-11-18	12-04-19
RES1280	Betonagem Barragem	22-03-19	24-09-20
RES1290	Enchimento da Albufeira (Até a cota 882)	25-09-20	25-02-21
DESMATAÇÃO		22-05-19	24-09-20
RES1300	Desmatação GOUVÃES	22-05-19	24-09-20
ENTRADA EM SERVIÇO		22-07-20	29-12-21
RES1310	EES Sistemas Comuns	22-07-20	23-11-20
RES1320	EES Grupo 4	22-09-20	16-04-21

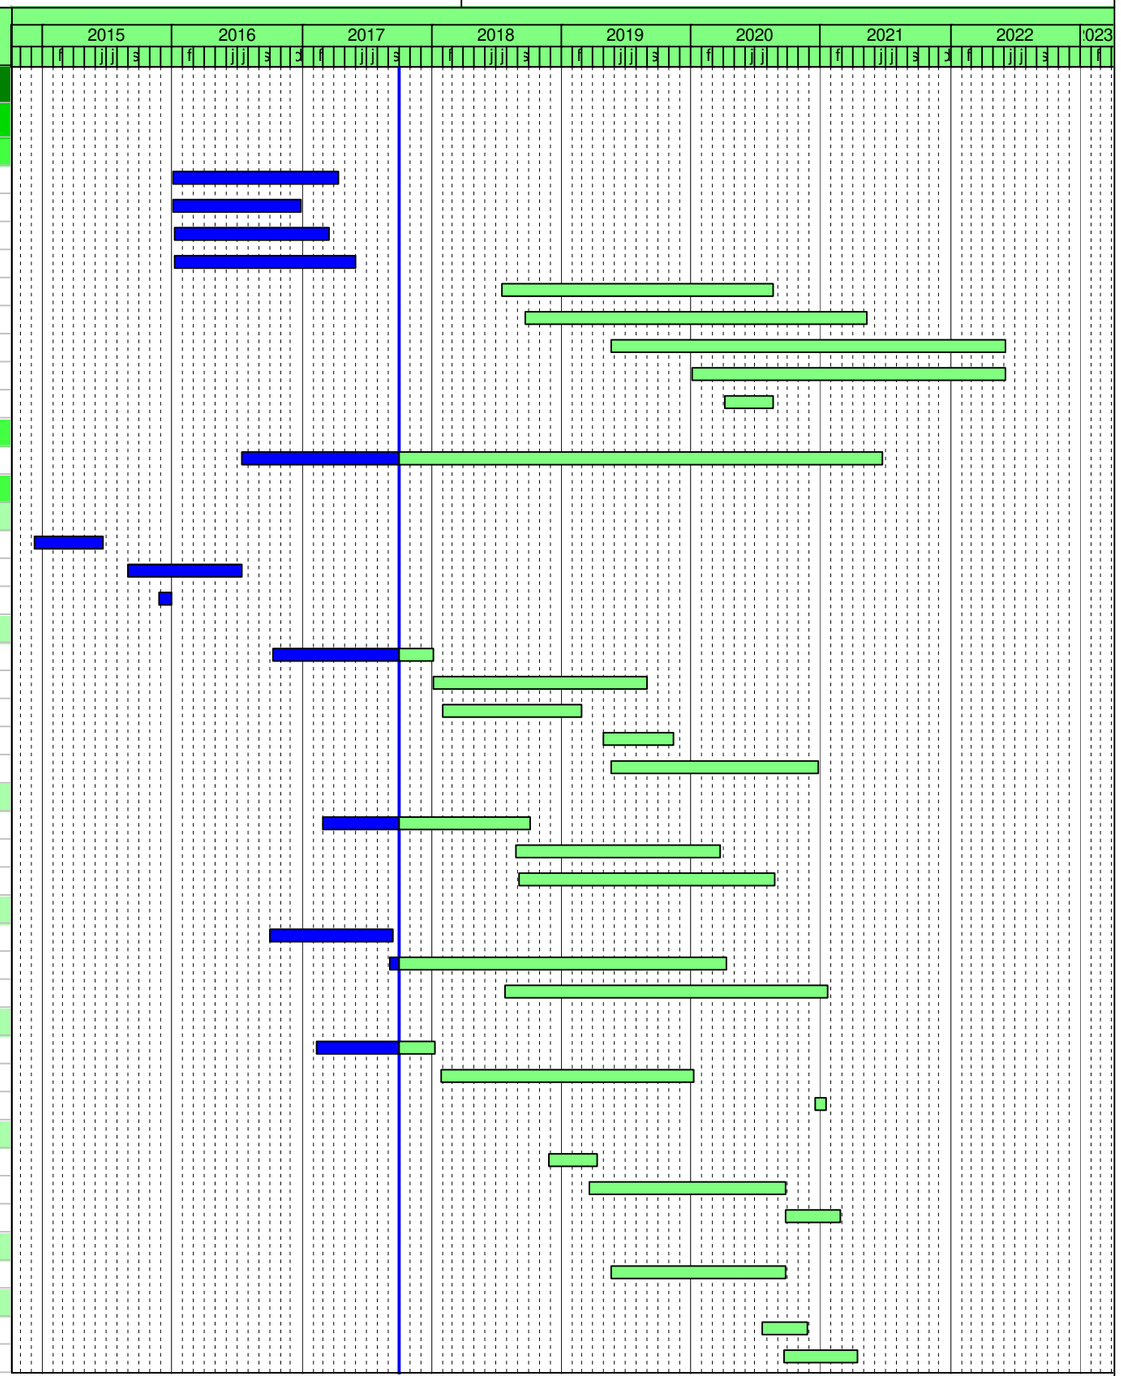


Trabajo Actual
Remaining Work
Hito

SE ALTO TAMEGA
PROGRAMA RESUMO

TAM LBrev1 ACT 1709-1

ACT 01-10-2017

Activity ID	Activity name (Portugues)	Start	Finish
RES1330	EES Grupo 3	09-12-20	08-06-21
RES1340	EES Grupo 2	09-02-21	27-07-21
RES1315	Disponibilida de de água para EES Dinâmicas	18-03-21	18-03-21
RES1350	EES Grupo 1	26-03-21	15-09-21
RES1355	Entrada em Serviçio Gouvães		29-12-21
TÂMEGA		26-02-16 A	03-02-23
ACESSOS		26-02-16 A	28-06-18
RES1720	Acessos Margem Esquerda	26-02-16 A	28-06-18
RES1730	Acessos Margem Direita	15-05-17 A	06-12-17
DESVIO DE RIO		15-12-16 A	17-09-18
RES1700	Túnel de Desvio	15-12-16 A	20-08-18
RES1710	Ensecadeira auxiliar	01-08-17 A	17-09-18
BARRAGEM		22-12-17	12-05-22
RES1660	Escavação Barragem	22-12-17	17-01-19
RES1680	Descarregadores	23-01-18	09-07-20
RES1670	Betonagem Barragem	10-09-18	29-09-20
RES1690	Enchimento Albufeira	15-10-21	12-05-22
CENTRAL		03-08-18	11-11-21
RES1630	Escavação	03-08-18	07-01-19
RES1640	Betonagem	08-01-19	15-12-20
RES1820	Montagem partes embebidas de Grupo	07-02-19	17-06-20
RES1650	Arquitetura e acabamentos Central	16-12-20	06-08-21
RES1840	Montagem Grupos	02-04-21	11-11-21
CIRCUITO HIDRÁULICO		11-03-19	29-10-20
RES1620	Forçadas	11-03-19	19-04-19
RES1600	Tomada e Poço de ensecadeiras	26-06-19	29-10-20
DESMATAÇÃO		19-02-20	24-06-21
RES1610	Desmatação TÂMEGA	19-02-20	24-06-21
ENTRADA EM SERVIÇO		26-01-22	03-02-23
RES1560	EES Sistemas Comúns	26-01-22	11-05-22
RES1580	EES Grupo 1	12-05-22	12-09-22
RES1570	EES Grupo 2	18-07-22	05-10-22
RES1575	Entrada em Serviçio Tãmega		03-02-23
DAIVÕES		01-09-15 A	29-12-21
ACESSOS		01-09-15 A	29-12-17
RES1380	Acessos Margem Esquerda	01-09-15 A	08-03-17 A
RES1390	Acessos Margem Direita	27-05-16 A	29-12-17
DESVIO DE RIO		13-06-16 A	07-11-17
RES1400	Túnel de Desvio	13-06-16 A	18-10-17
RES1410	Ensecadeira auxiliar	03-04-17 A	07-11-17
BARRAGEM		09-03-17 A	18-05-21
RES1420	Escavação Barragem	09-03-17 A	24-01-18
RES1430	Betonagem Barragem	01-03-18	11-09-19
RES1440	Descarregador (Bacia de dissipação)	30-07-18	26-06-19
RES1450	Enchimento Albufeira	15-10-20	18-05-21
AÇUDE E REGULARIZAÇÃO DO RIO		01-05-19	30-11-20

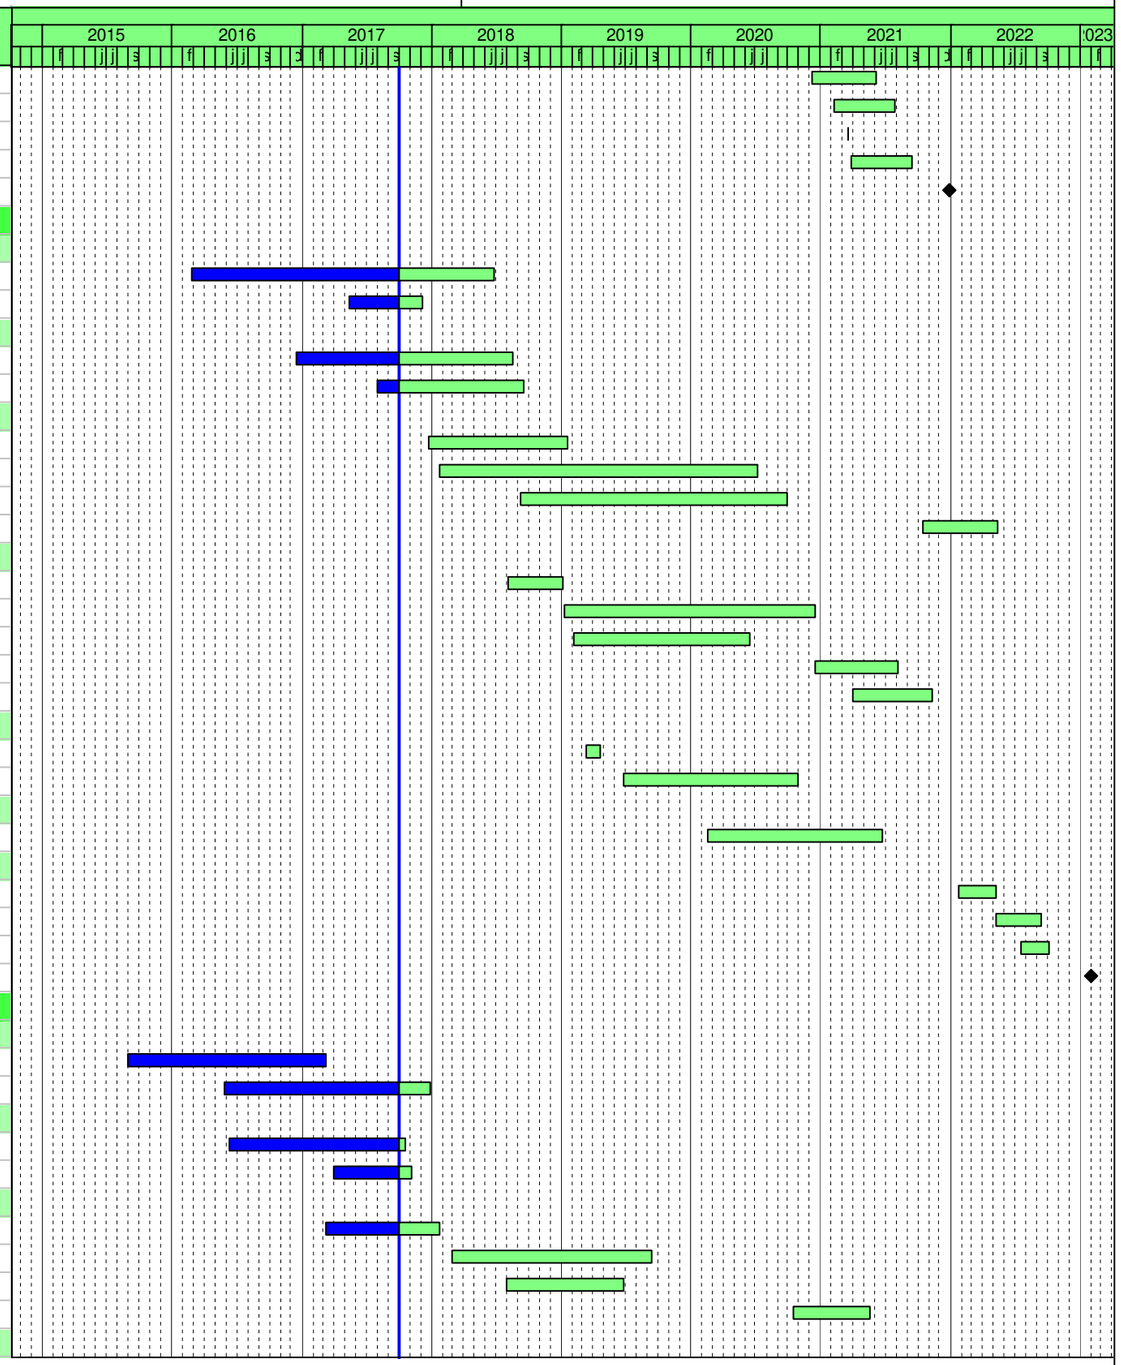


Trabajo Actual
Remaining Work
Hito

SE ALTO TAMEGA
PROGRAMA RESUMO

ACT 01-10-2017

Activity ID	Activity name (Portugues)	Start	Finish
RES1760	Escavação	01-05-19	20-11-20
RES1770	Açude	04-07-19	30-11-20
CENTRAL		07-03-17 A	26-08-21
RES1460	Escavação	07-03-17 A	19-04-18
RES1470	Betonagem	27-04-18	10-10-19
RES1800	Montagem partes embebidas de Grupo	07-05-18	10-05-19
RES1480	Arquitetura e acabamentos Central	28-11-19	08-10-20
RES1810	Montagem Grupos	29-04-20	26-08-21
CIRCUITO HIDRÁULICO		26-06-17 A	12-02-20
RES1490	Tomada e Poço de ensecadeiras	26-06-17 A	12-02-20
RES1500	Forçadas	25-09-17 A	02-10-19
RES1750	Condução Forçada Caudal ecológico	06-08-18	18-09-19
DESMATAÇÃO		18-02-19	23-06-20
RES1510	Desmatação DAIVÕES	18-02-19	23-06-20
ENTRADA EM SERVIÇO		23-12-20	29-12-21
RES1530	EES Sistemas Comuns	23-12-20	23-04-21
RES1540	EES Grupo 2	13-05-21	05-08-21
RES1740	EES Grupo Caudal Ecológico	27-05-21	21-06-21
RES1550	EES Grupo 1	10-08-21	03-11-21
RES1850	Entrada em Serviçio Tâmega		29-12-21

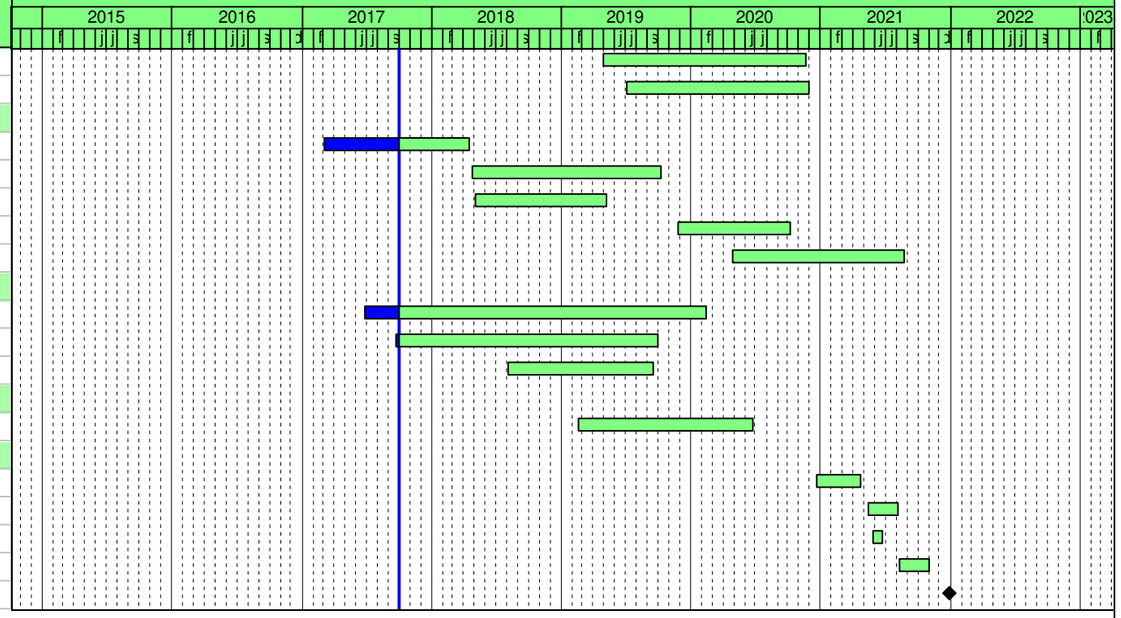

Trabajo Actual
Remaining Work
Hito

SE ALTO TAMEGA
PROGRAMA RESUMO
