Parque de Pampilhosa da Serra-Energia Eólica S.A.
Mapa da Construção 18-02-02 (RECAPE)
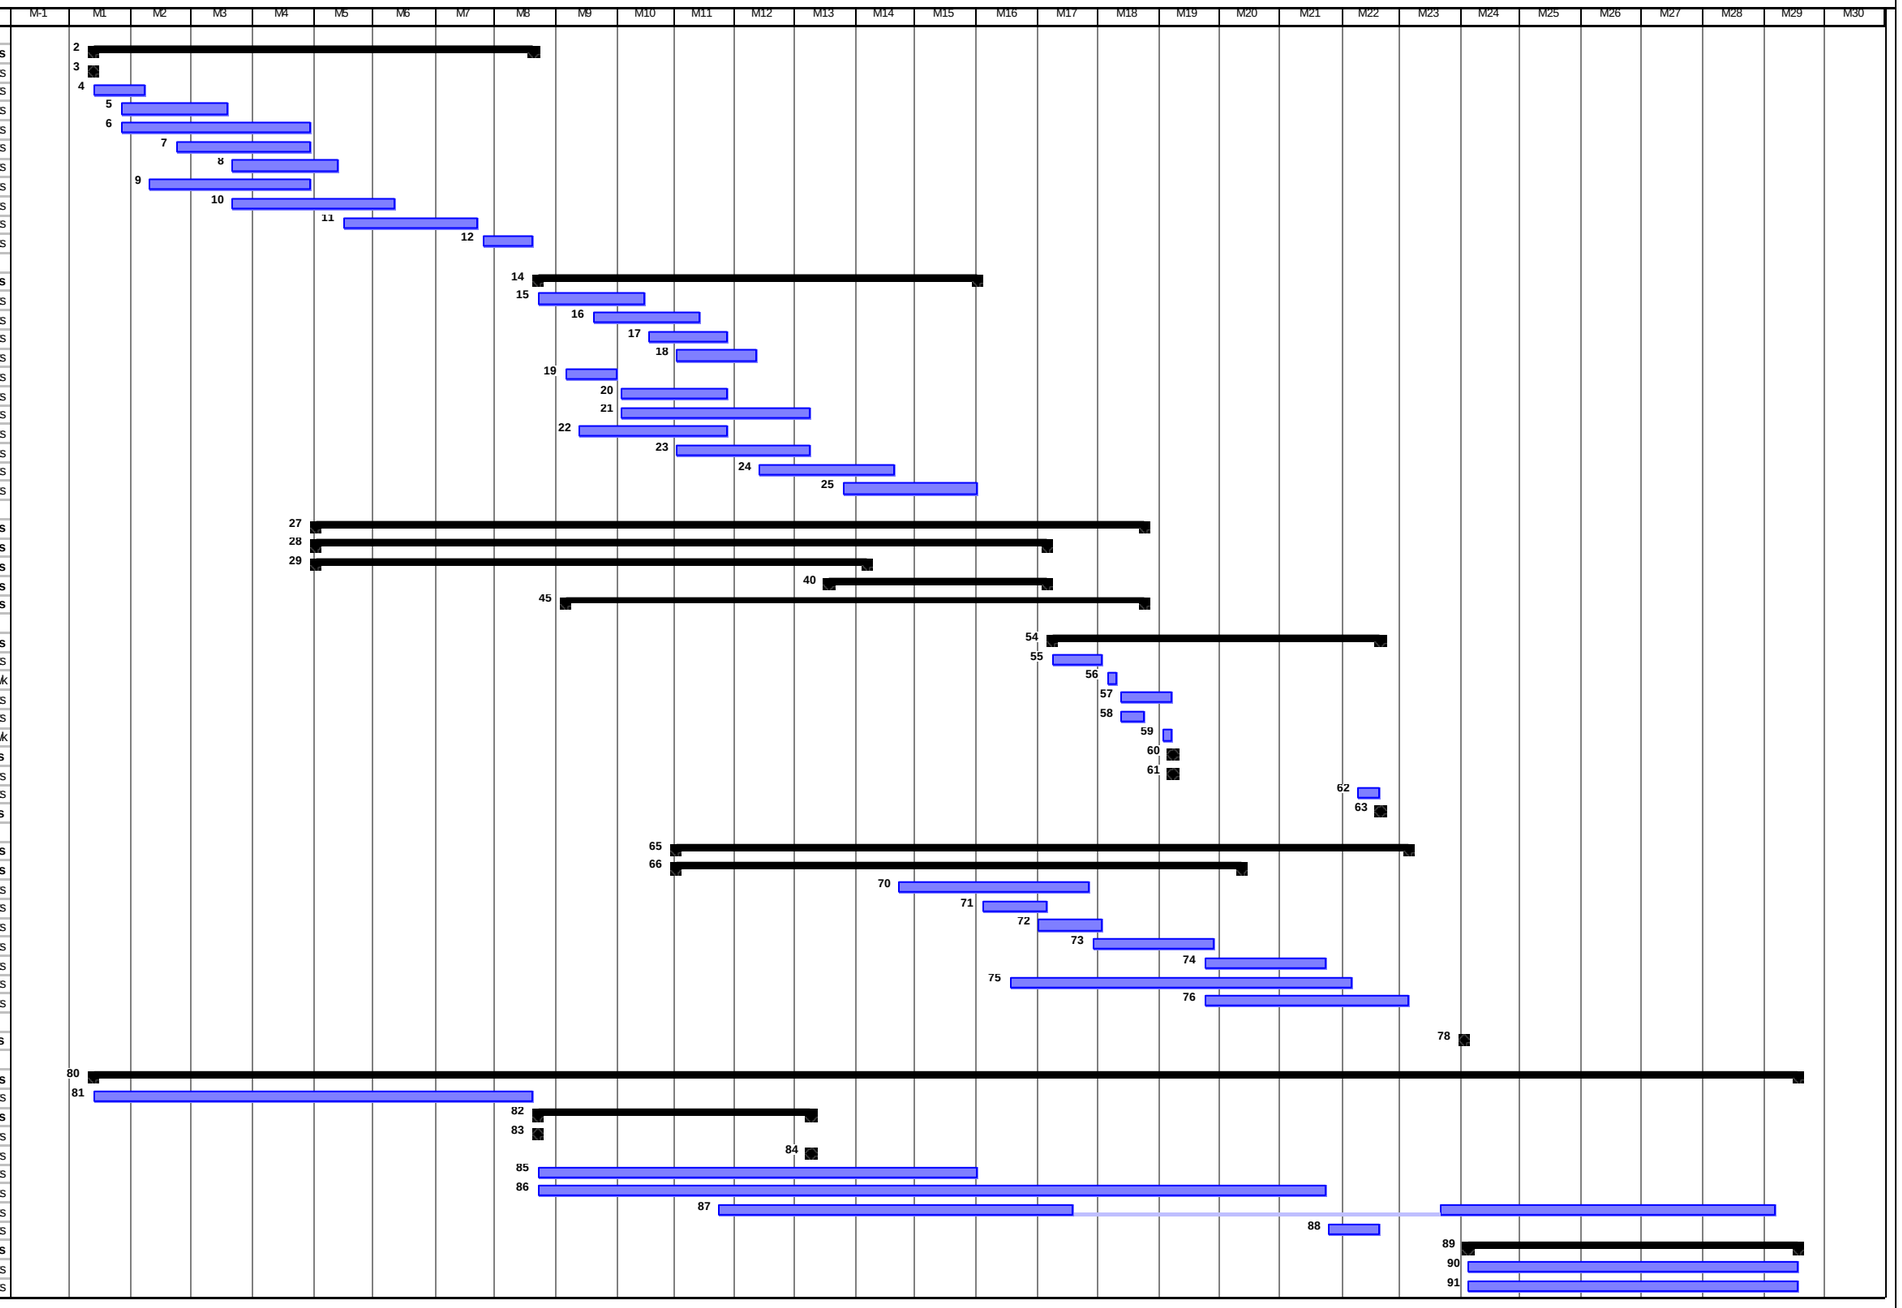
ID	Versão Portuguesa	Duration
1		
2	**220kV Trabalhos da Linha**	**32 wks**
3	Licença para const. da Linha	0 wks
4	Mobilização, e Proj. p/ const. Da linha, etc..	4 wks
5	Produção e entrega dos Postes	8 wks
6	Produção e entrega dos cabos	14 wks
7	Produção e entrega dos Isoladores	10 wks
8	Pordução e entrega dos Acessórios	8 wks
9	Const das fundações dos postes	12 wks
10	Instalação dos Postes	12 wks
11	Instalação dos Cabos	10 wks
12	Inspecçoes sem Tensão	4 wks
13		
14	**Edifício e trabalhos de construção Civil**	**32 wks**
15	Caminhos de acesso p/ circuito 3	8 wks
16	Caminhos de acesso p/ circuito 4	8 wks
17	Caminhos de acesso p/ circuito 2	6 wks
18	Caminhos de acesso p/ circuito 1	6 wks
19	Sistema de terras do Subestação	4 wks
20	Parque de Equipamentos	8 wks
21	Edifício de Controle e Comando	14 wks
22	Fundações dos aerogerodores P/ circuito 3	11 wks
23	Fundações dos aerogerodores P/ circuito 4	10 wks
24	Fundações dos aerogerodores P/ circuito 2	10 wks
25	Fundações dos aerogerodores P/ circuito 1	10 wks
26		
27	**Subestação e trabalhos eléctricos**	**60 wks**
28	**Subestação de 220kV**	**53 wks**
29	**Aprovisionamento de Equipamentos**	**40 wks**
40	**Instalação de Equipamnetos da Subestação**	**16 wks**
45	**Trabalhos de 30kV no Parque Eólico**	**42 wks**
53		
54	**Aprovações da REN/DGE**	**24 wks**
55	Entrega e aprovação dos Projectos rectificativos	4 wks
56	Pedido de Ligação temporária PE + Linha	1 wk
57	Ensaios e Licença para a linha pela REN/DGE	4 wks
58	Ensaios e Licença da subestação pela REN/DGE	2 wks
59	Pedido de Vistoria Final da Linha	1 wk
60	**Ligação do Parque Eólico + Linha**	**0 days**
61	Vistoria final pela DGE da Linha	0 days
62	Pedido de Vistoria Final do PE	2 wks
63	**Vistoria final pela DGE do PE**	**0 days**
64		
65	**Trabalhos dos Aerogeradores**	**53 wks**
66	**Produção das Torres (Portugal)**	**41 wks**
70	Produção da Nacele e pás (DK)	14 wks
71	Entrega e instalação das torres p/ circuito 3	5 wks
72	Entrega e instalação das torres p/ circuito 4	5 wks
73	Entrega e instalação das torres p/ circuito 2	9 wks
74	Entrega e instalação das torres p/ circuito 1	9 wks
75	Comissionamento	25 wks
76	Testes de Performance dos Aerogeradores	15 wks
77		
78	**Entrega do Projecto**	**0 days**
79		
80	**Trabalhos de acompanhamento ambiental**	**123 wks**
81	Acompanhamento ambiental da linha aérea (separado)	32 wks
82	**Acompanhamento ambiental do parque eólico**	**20 wks**
83	Emissão da licença da utilização do dominio hídrico	0 days
84	Vistoria da sistema de tratemento das águas residuais	0 days
85	Acompanhamento arquéológico da construção	32 wks
86	Preenchimento dos relatórios de acomp. Ambiental (mensalmente)	57 wks
87	Época reproductiva da ecologia (desmatação não permitida)	50 wks
88	Recuperação paigística	4 wks
89	**Monitorização pós-construção**	**24 wks**
90	Flora	24 wks
91	Avifauna	24 wks
