


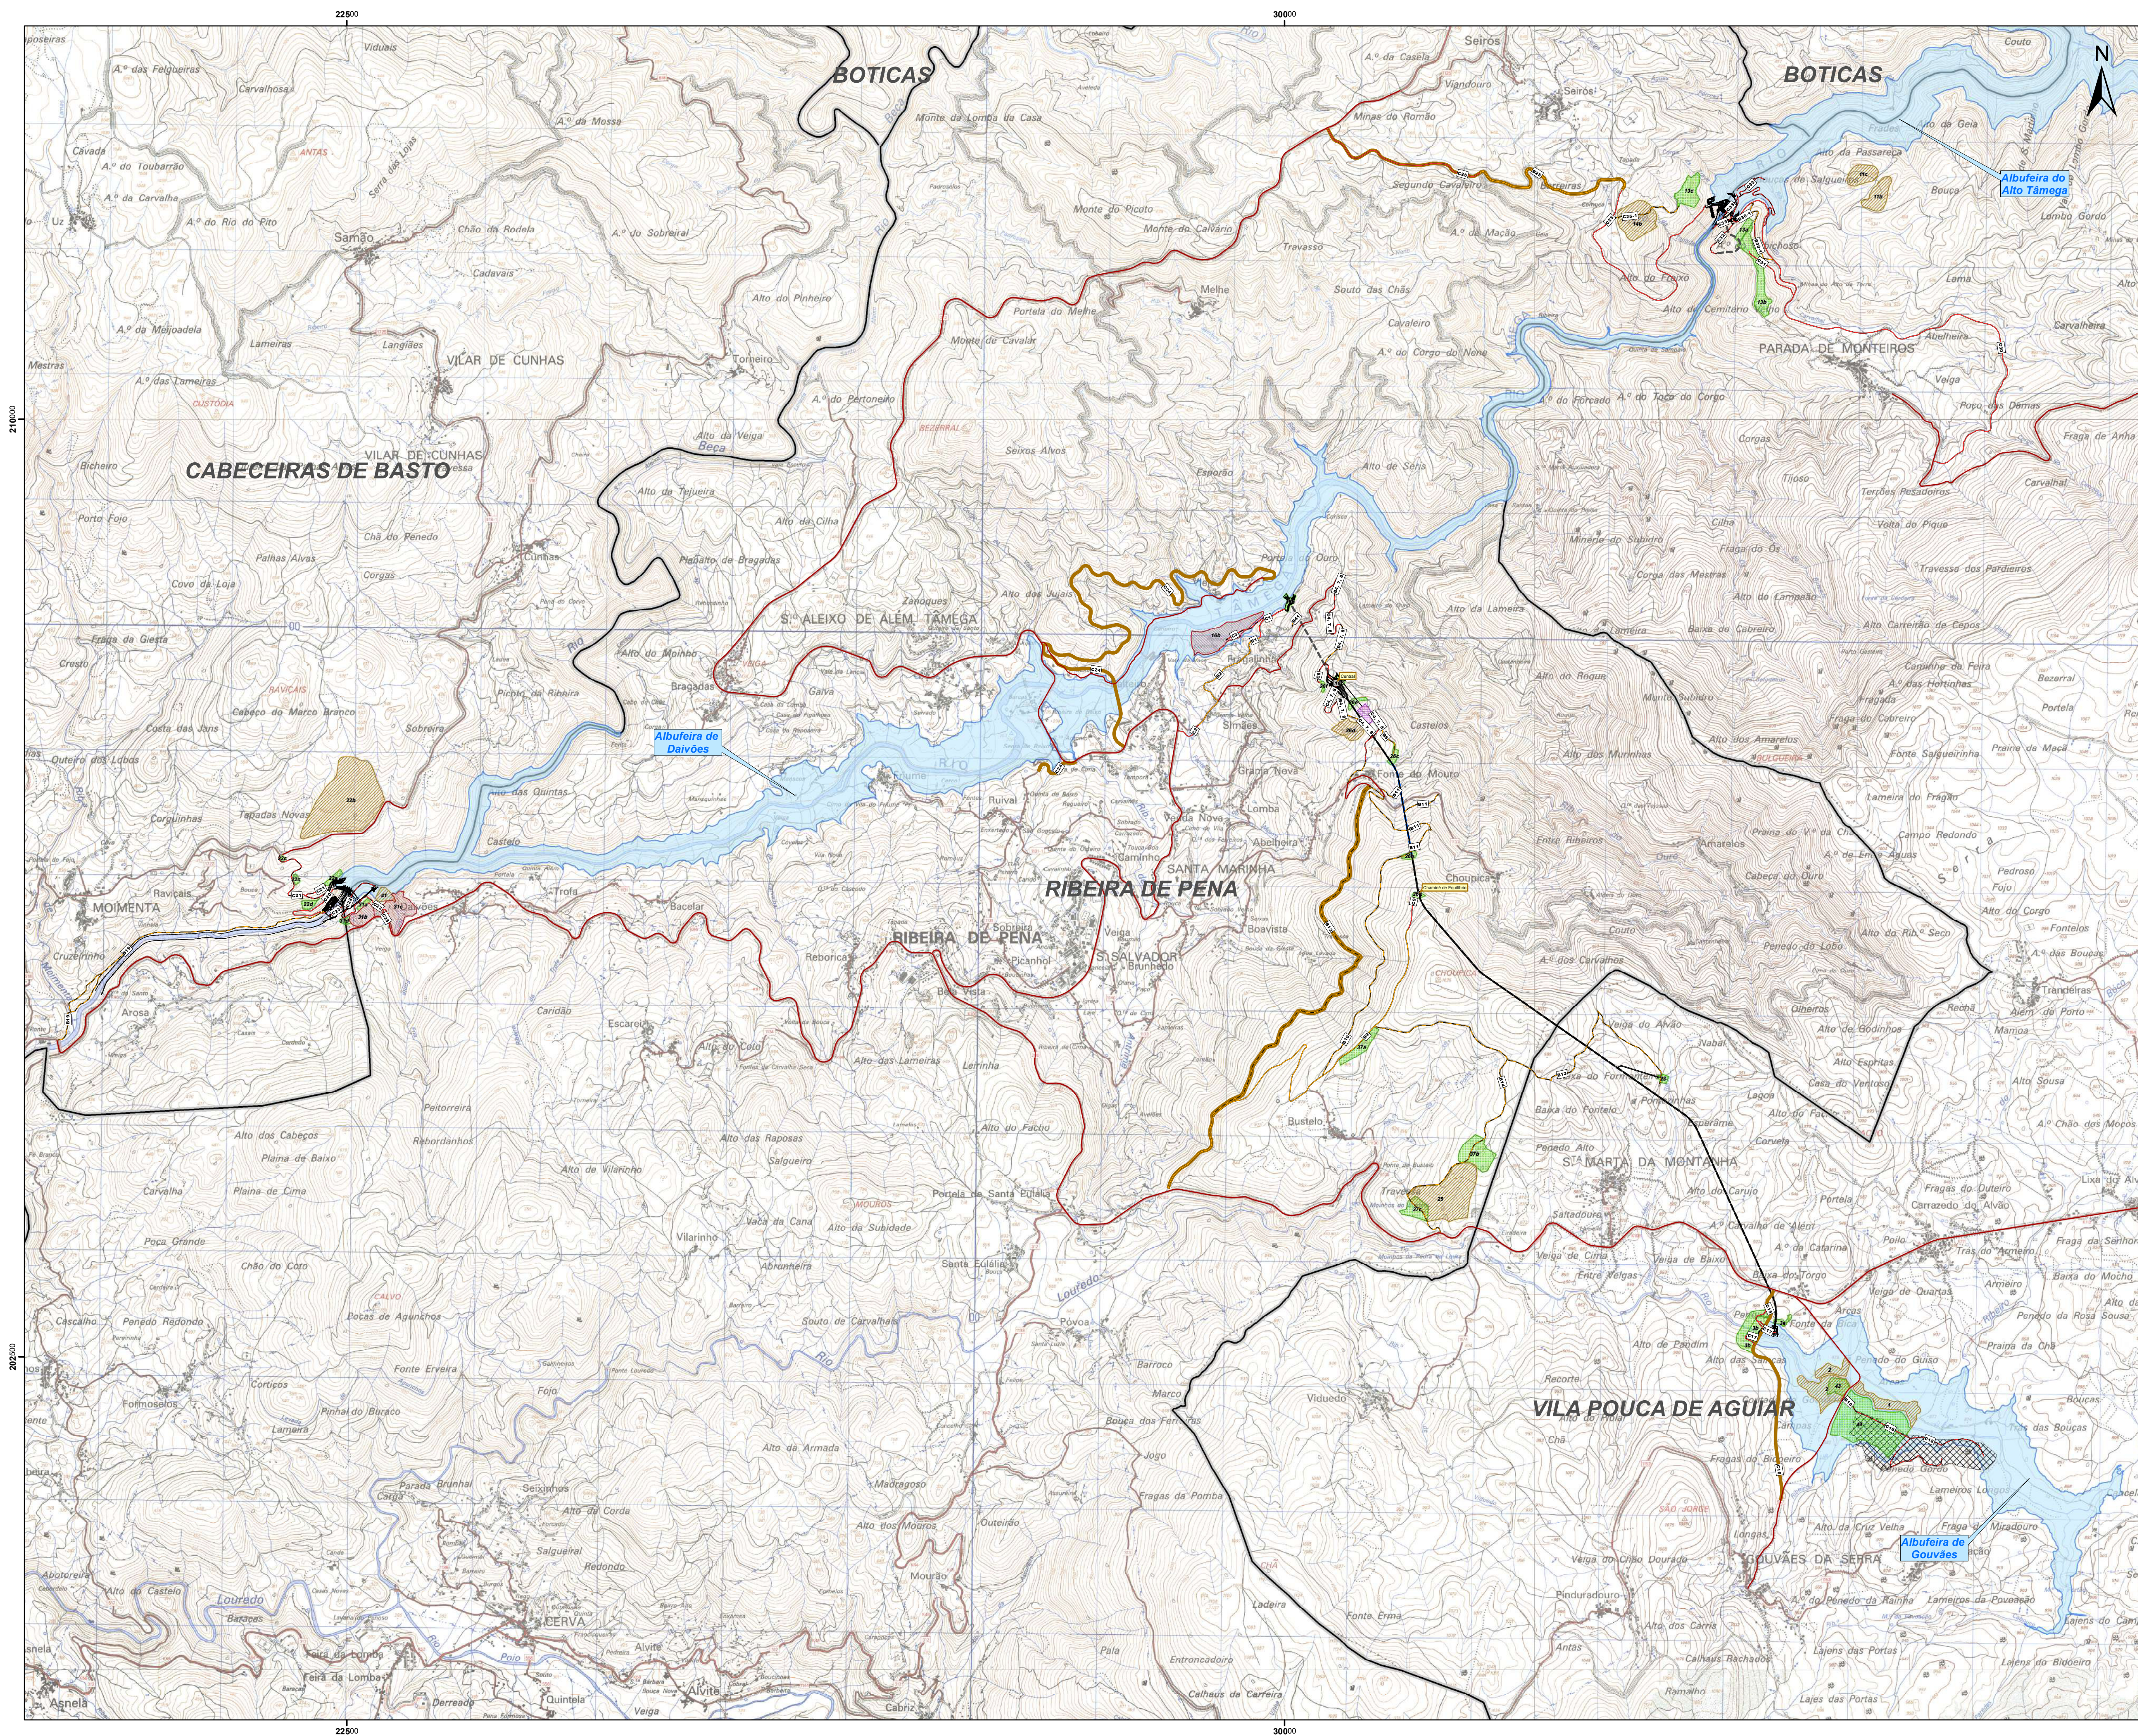

Aproveitamento hidroeléctrico

- Albufeira
- Subestação
- Estaleiro
- Estaleiro/escombreira
- Escombreira
- Pedreira
- Central
- Chaminé de Equilíbrio


Circuito hidráulico

- Túnel
- Vala

Acessos

- Acesso existente
- Acesso a beneficiar
- Permanente
- Temporário
- Acesso a construir
- Permanente
- Temporário
- Medida de compensação sócio-económica/ reposição de acesso existente

- Limites administrativos
- Limite de concelho

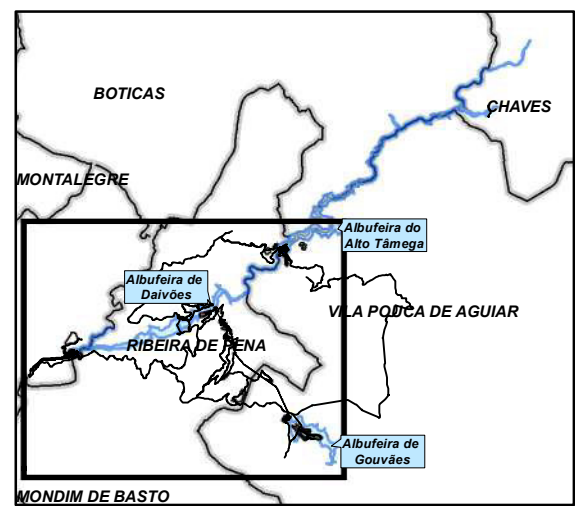

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



www.procesl.pt




PROJETOS DE DETALHE

PROJETO DE DETALHE

ENQUADRAMENTO DO PROJETO

Escalas	1:25 000	Projeto:	Desenho:
Data:	28/02/2018	Processo:	Verificação:
Ficheiro:	T2017-346-01		Aprovação:

Desenho Nº	1	Revisão
------------	---	---------

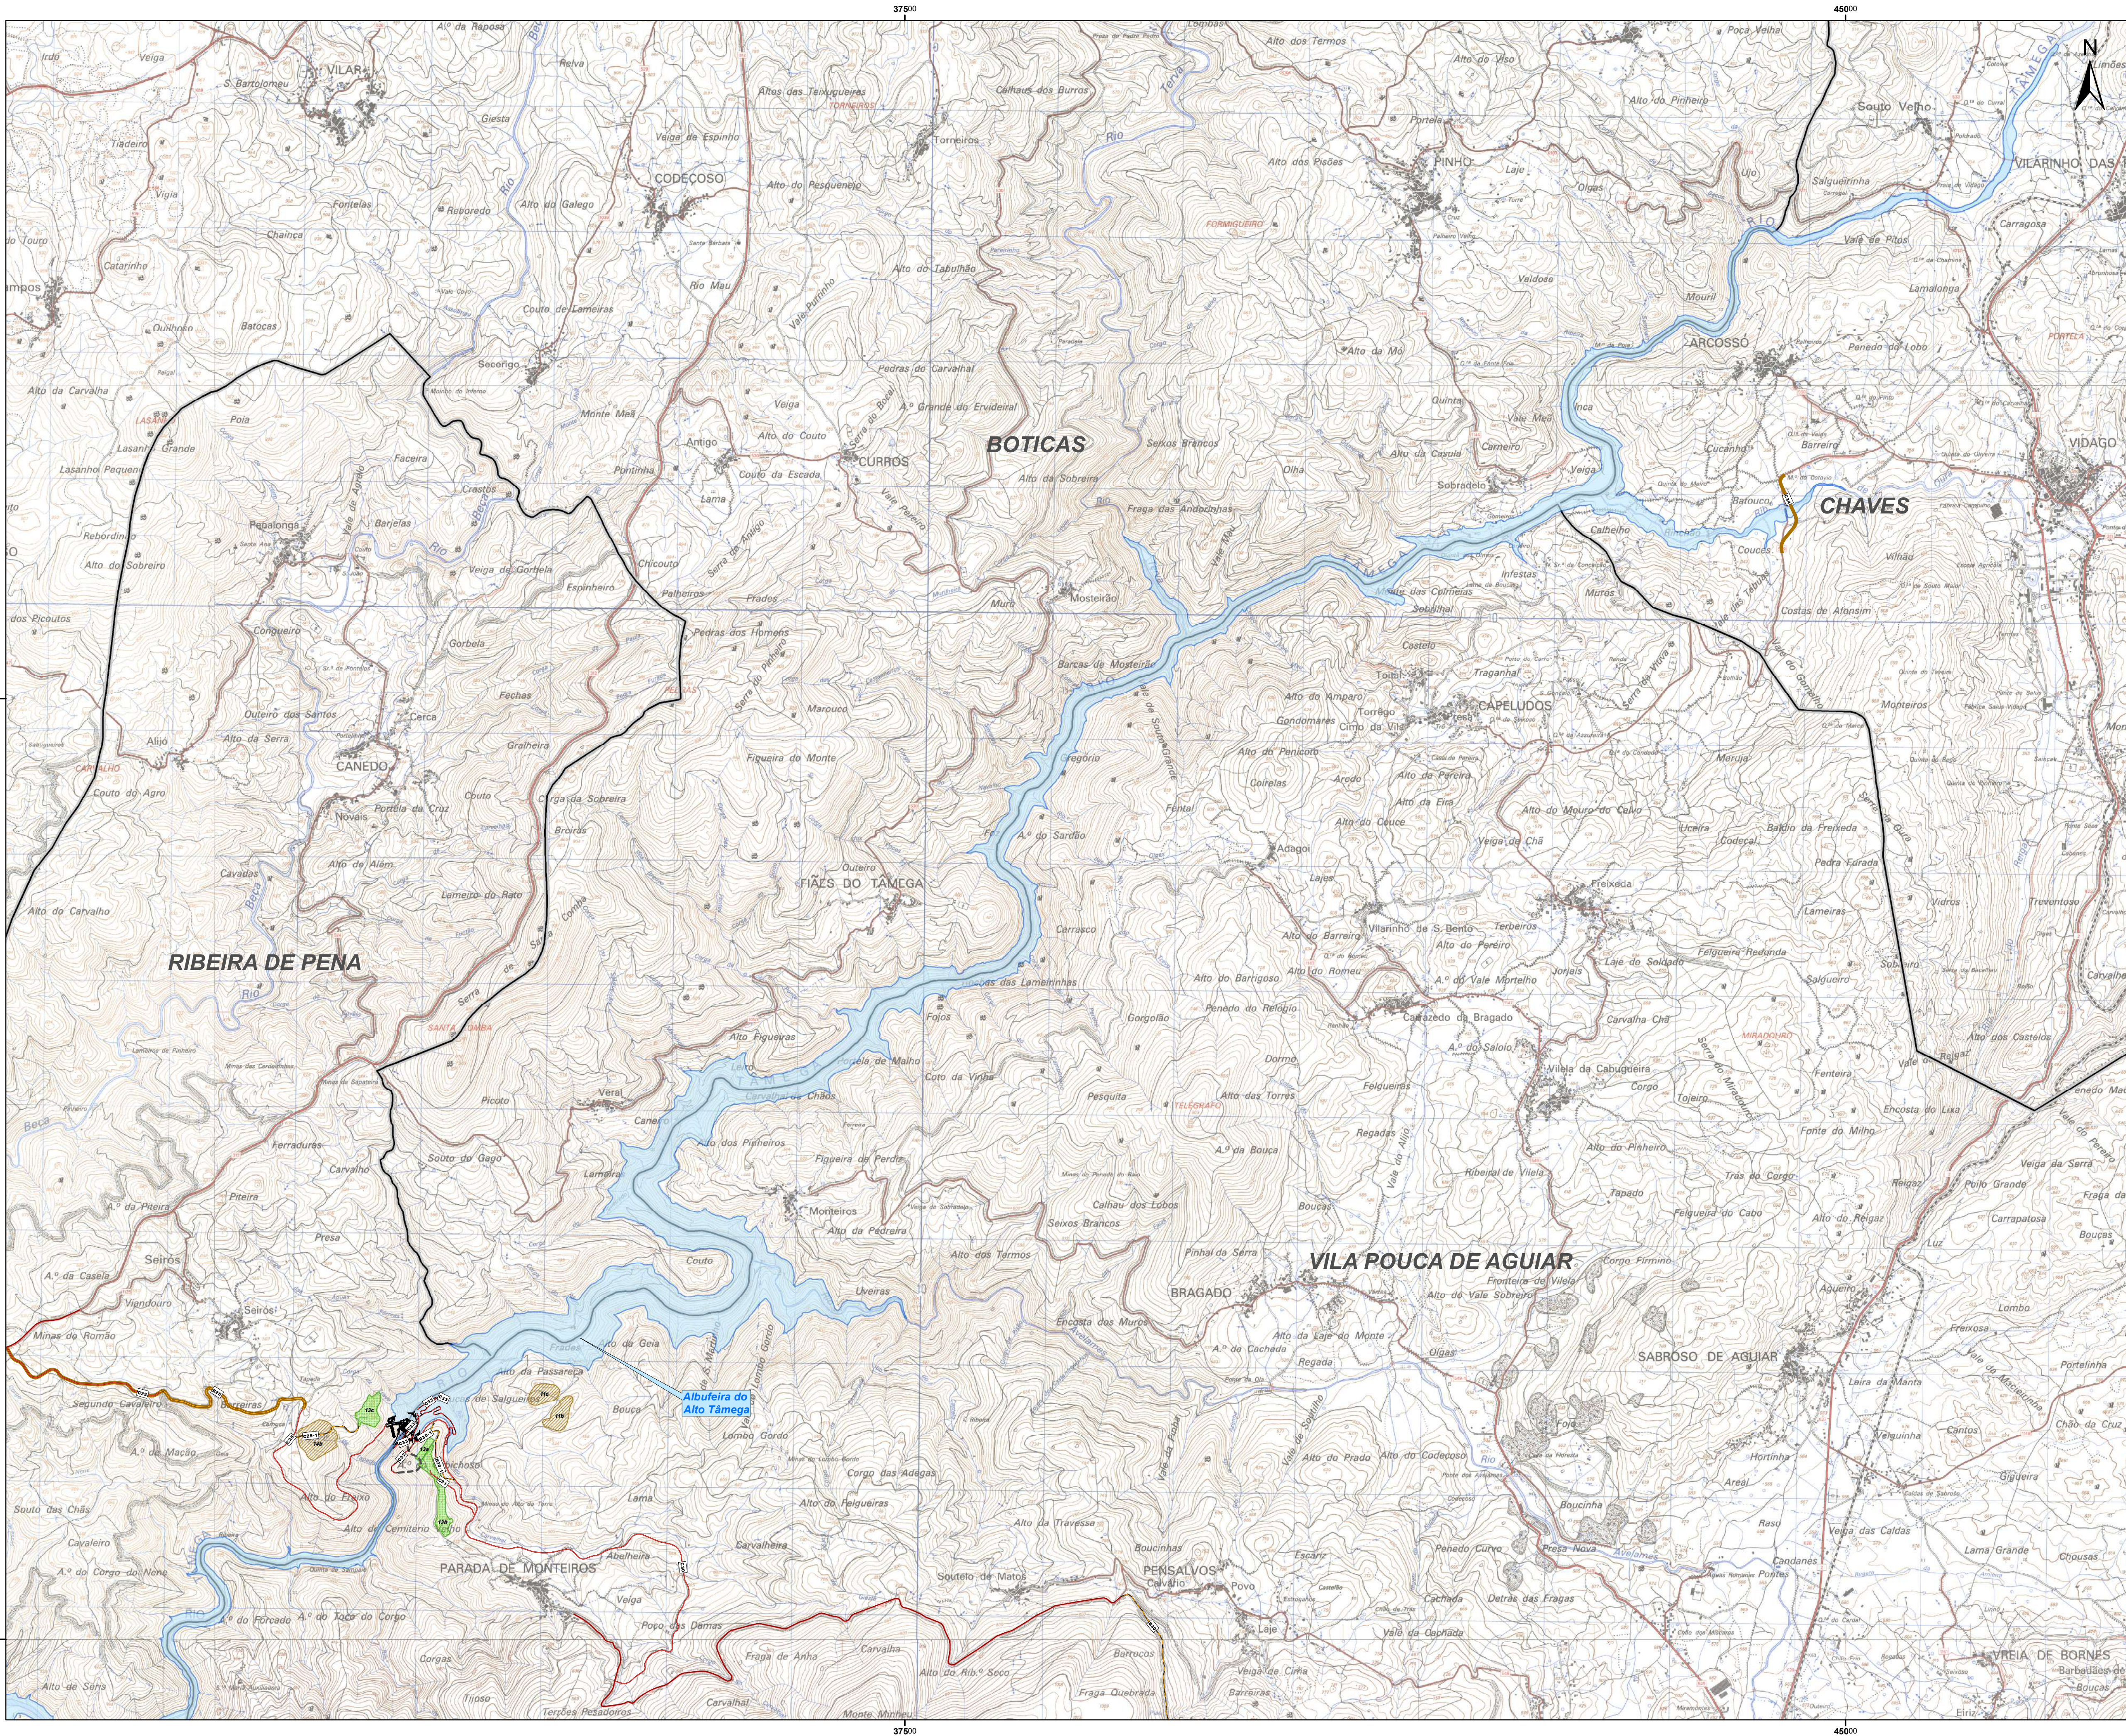

Aproveitamento hidroeléctrico

- Albufeira
- Subestação
- Estaleiro
- Estaleiro/escobreira
- Escobreira
- Pedreira
- Central
- Chaminé de Equilíbrio


Circuito hidráulico

- Túnel
- Vaia

Acessos

- Acesso existente
- Acesso a beneficiar
- Permanente
- Temporário
- Acesso a construir
- Permanente
- Temporário
- Medida de compensação sócio-económica/ reposição de acesso existente

- Limites administrativos
- Limite de concelho

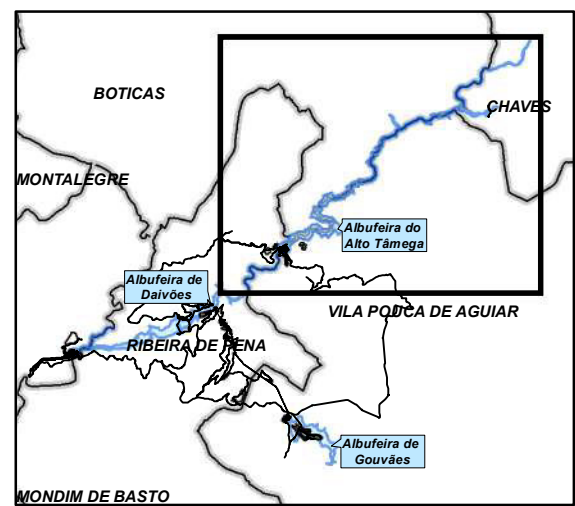

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



APROVEITAMENTOS
HIDROELÉCTRICOS DE
GOUVÃES, ALTO TÂMEGA E DAIVÕES

PROJETO DE DETALHE

ENQUADRAMENTO DO PROJETO


Escalas:	1:25 000	Projeto:	Desenhado:
Data:	28/02/2018	Processo:	Verificado:
Ficheiro:	T2017-346-01	Ficheiro:	Aprovado:

Desenho Nº	1	Revisão
------------	---	---------

 Trabajo Actual
 Remaining Work
 Critical Remaining Work
 Hito

SE ALTO TAMEGA

PROGRAMA RESUMO

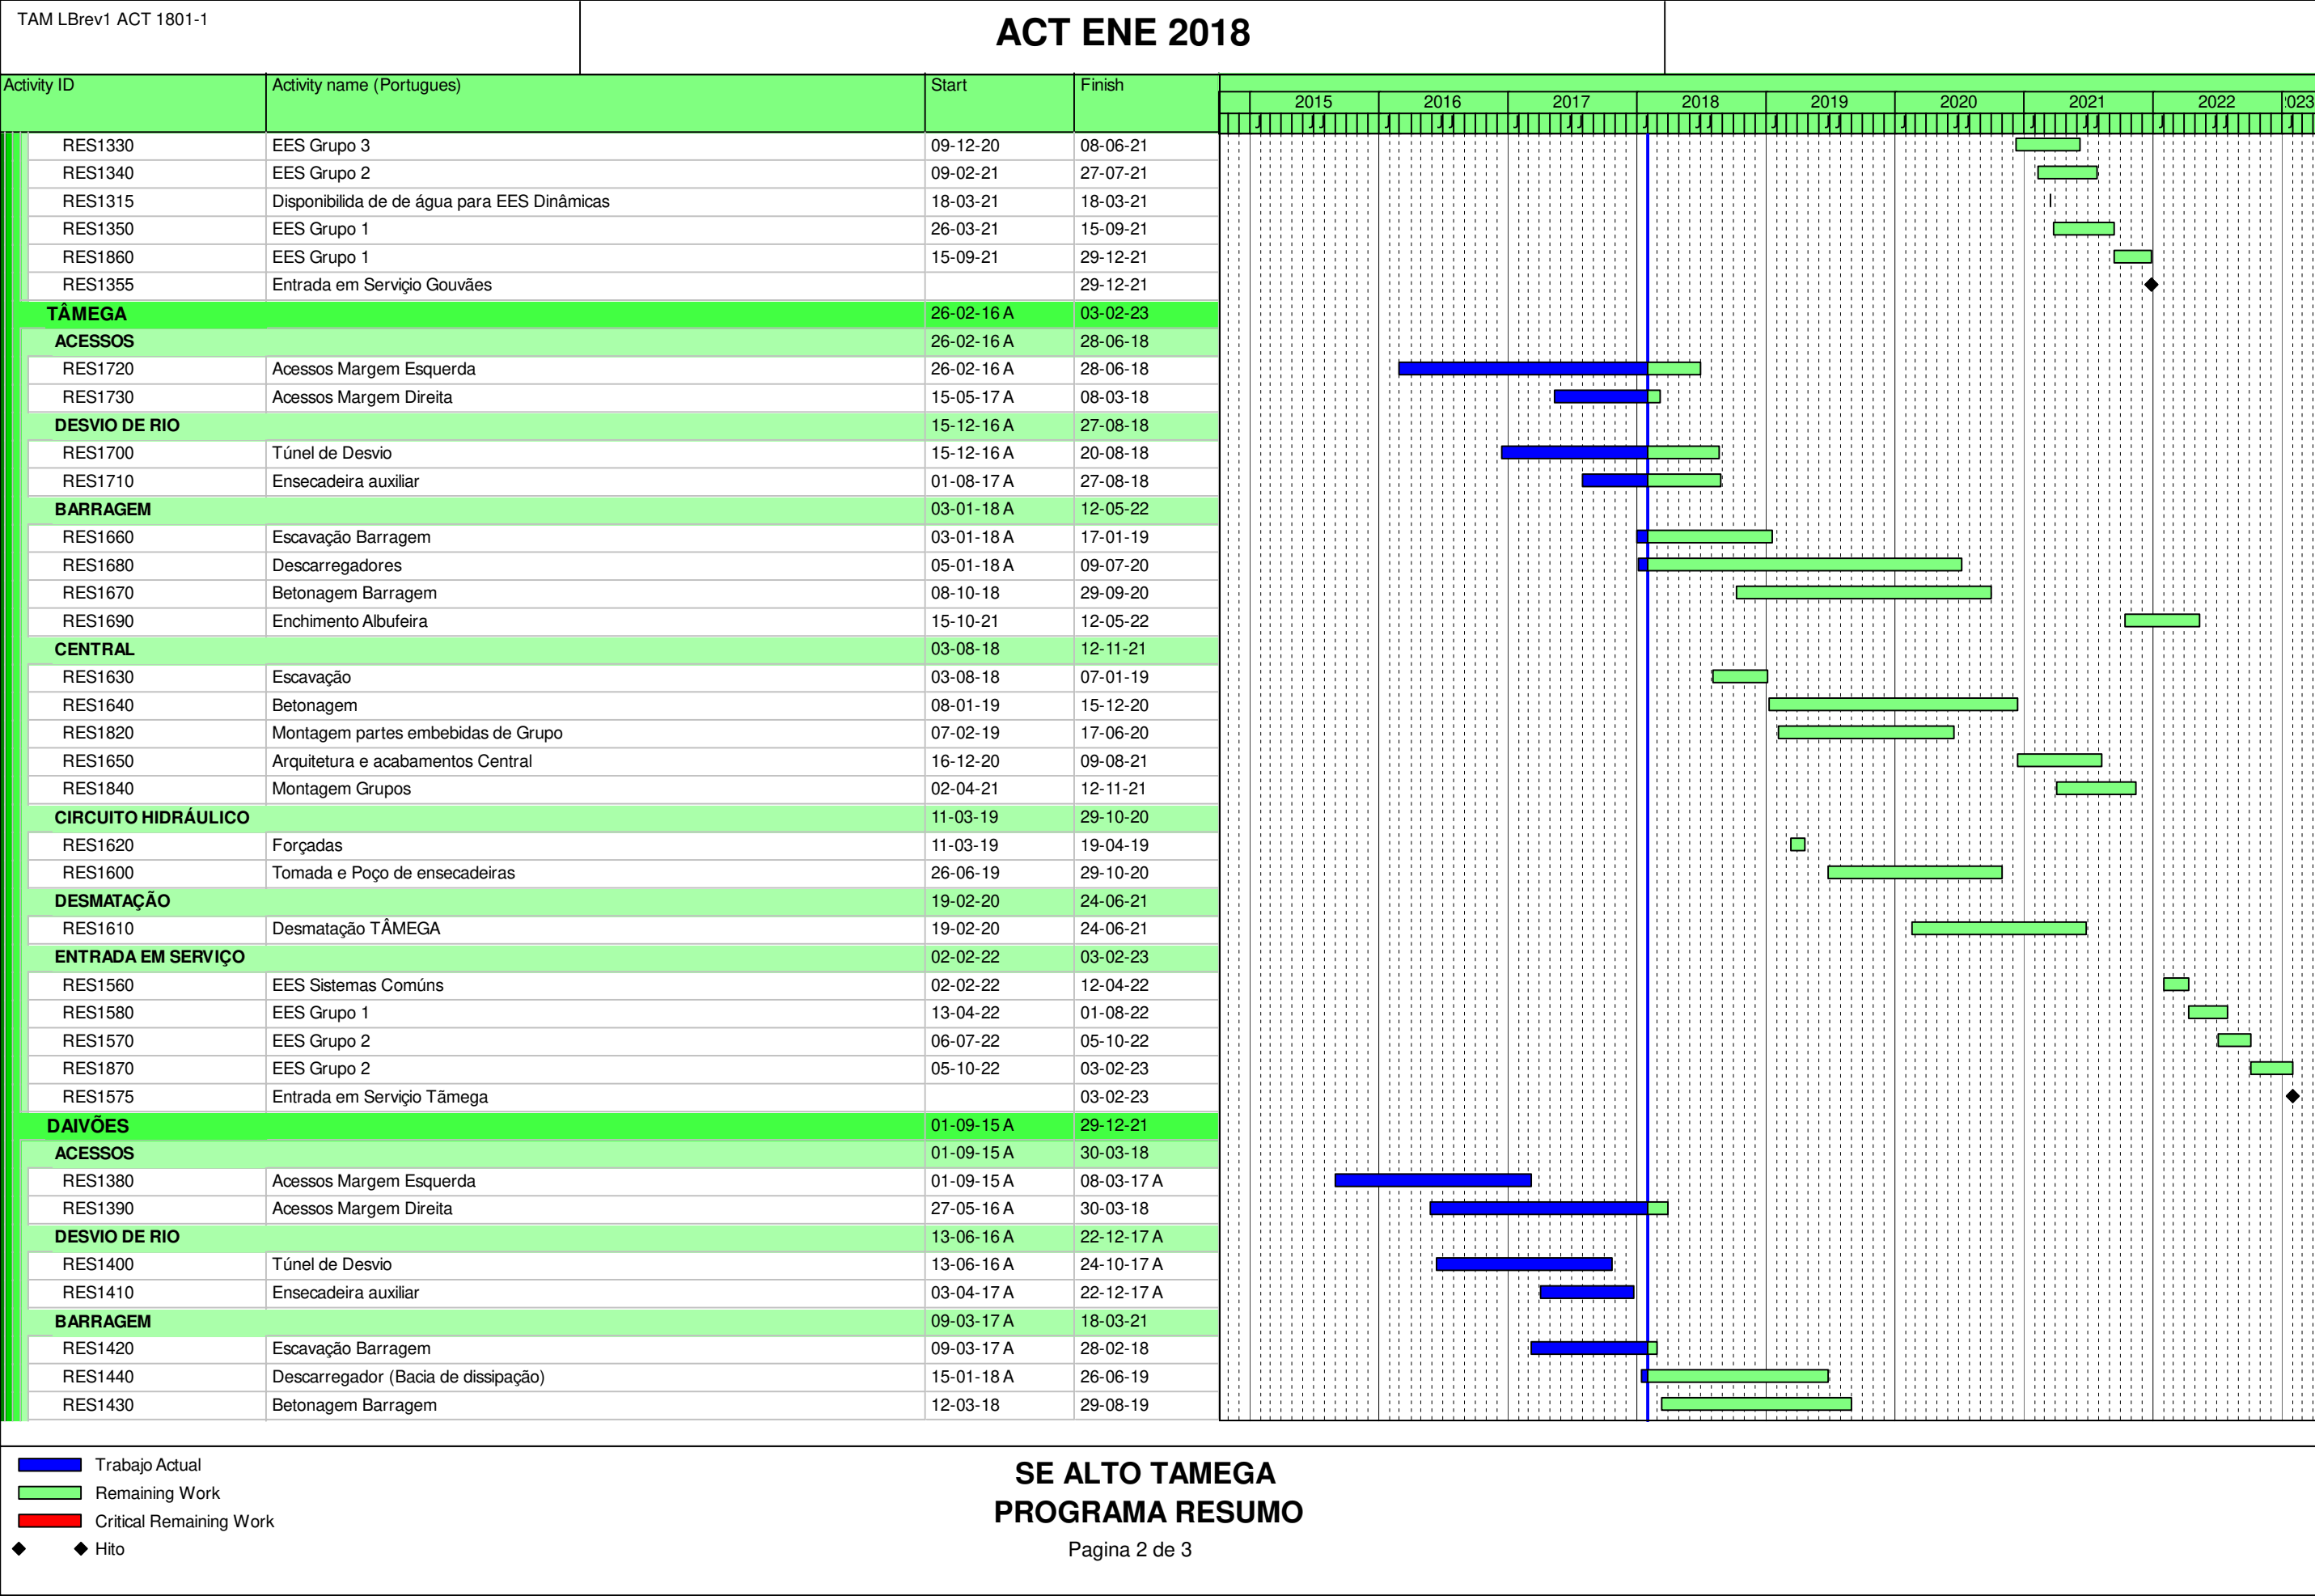

ACT ENE 2018

Activity ID		Activity name (Portugues)	Start	Finish																																																																																																																																
					2015												2016												2017												2018												2019												2020												2021												2022												2023																															
	RES1450	Enchimento Albufeira	15-10-20	18-03-21																																																																																																																																
	AÇUDE E REGULARIZAÇÃO DO RIO		03-06-19	17-11-20																																																																																																																																
	RES1760	Escavação	03-06-19	13-11-20																																																																																																																																
	RES1770	Açude	12-09-19	17-11-20																																																																																																																																
	CENTRAL		07-03-17 A	26-08-21																																																																																																																																
	RES1460	Escavação	07-03-17 A	12-04-18																																																																																																																																
	RES1470	Betonagem	13-04-18	10-10-19																																																																																																																																
	RES1800	Montagem partes embebidas de Grupo	07-05-18	10-05-19																																																																																																																																
	RES1480	Arquitetura e acabamentos Central	28-11-19	08-10-20																																																																																																																																
	RES1810	Montagem Grupos	29-04-20	26-08-21																																																																																																																																
	CIRCUITO HIDRÁULICO		26-06-17 A	25-02-20																																																																																																																																
	RES1490	Tomada e Poço de ensecadeiras	26-06-17 A	25-02-20																																																																																																																																
	RES1500	Forçadas	25-09-17 A	06-11-19																																																																																																																																
	RES1750	Condução Forçada Caudal ecológico	12-07-18	18-09-19																																																																																																																																
	DESMATAÇÃO		01-02-18	15-06-20																																																																																																																																
	RES1510	Desmatação DAIVÕES	01-02-18	15-06-20																																																																																																																																
	ENTRADA EM SERVIÇO		23-12-20	29-12-21																																																																																																																																
	RES1530	EES Sistemas Comuns	23-12-20	23-04-21																																																																																																																																
	RES1740	EES Grupo Caudal Ecológico	04-05-21	27-05-21																																																																																																																																
	RES1540	EES Grupo 2	13-05-21	05-08-21																																																																																																																																
RES1550	EES Grupo 1	10-08-21	03-11-21																																																																																																																																	
RES1880	EES Grupo 1	03-11-21	29-12-21																																																																																																																																	
RES1850	Entrada em Serviço Tâmega		29-12-21																																																																																																																																	

 Trabajo Actual
 Remaining Work
 Critical Remaining Work
 Hito

SE ALTO TAMEGA PROGRAMA RESUMO
